

PLAN DE TRABAJO DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES

ANEXO 03: ESQUEMA DEL PLAN DE TRABAJO DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES

PROYECTO 1: PORTAL WEB INSTITUCIONAL Avance documentado al 50 %

1. PARTE INFORMATIVA

1.1. DATOS DE LOS PRACTICANTES

Practicante 1	AARON ROGER VILCA CARI
Codigo de matricula	217473
Practicante 2	CARMEN NIEVES APAZA CONDORI
Codigo de matricula	215349
Docente Supervisor	SUCASAIRE MONROY WILDO
Programa de Estudios	INGENIERIA DE SISTEMAS
Facultad	FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS

1.2. DURACION

Fecha de inicio	1 de abril de 2026
Fecha de finalizacion	31 de julio de 2026 (proyectado)
Fecha de corte del avance analizado	25 de mayo de 2026
Porcentaje de avance documentado	50 % del Proyecto 1 - Portal Web Institucional

1.3. DATOS DE LA EMPRESA O INSTITUCION

Razon Social	DIRECCION DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION CULTURAL
Area	PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION CULTURAL
Jefe del Area Receptora	DRA. MILDER ZANABRIA ORTEGA
Cargo del jefe	DIRECTOR
Correo electronico	milyzanabria@gmail.com
Telefono/Celular	951522828
Direccion	Universidad Nacional del Altiplano - Puno

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Desarrollar e implementar el Portal Web Institucional de la Direccion de Proyeccion Social y Extension Cultural de la Universidad Nacional del Altiplano, mediante una plataforma web moderna que permita centralizar informacion institucional, eventos, documentos de gestion, noticias, suboficinas y contenidos administrativos, asegurando una base funcional para su posterior despliegue, mantenimiento y administracion.

2.2. Objetivos especificos

- Analizar la estructura funcional del portal institucional y definir las secciones principales requeridas para la Direccion de Proyeccion Social y Extension Cultural.
- Implementar la base del frontend institucional utilizando React, Vite, Tailwind CSS, React Router y componentes reutilizables.
- Construir las paginas publicas principales del portal: Inicio, Nosotros, Documentos de Gestion y Eventos.
- Integrar una estructura visual institucional con logos oficiales, menu de navegacion, pie de pagina, enlaces a suboficinas y elementos responsivos.
- Desarrollar una API backend con FastAPI para gestionar informacion publica y administrativa del portal.
- Modelar una base de datos relacional con PostgreSQL, SQLAlchemy y Alembic para noticias, eventos, documentos, categorias, secciones institucionales, suboficinas, usuarios y configuracion del sitio.
- Implementar endpoints publicos para consulta de eventos, documentos, categorias, secciones institucionales, suboficinas y configuracion del portal.

- Implementar endpoints administrativos protegidos para creacion, actualizacion y eliminacion de contenidos.
- Configurar carga de archivos para documentos e imagenes, con validacion de extensiones permitidas.
- Configurar un entorno inicial de base de datos mediante Docker Compose y migraciones Alembic.
- Verificar la compilacion del frontend y la validez sintactica del backend como parte del avance tecnico alcanzado.

3. COMPONENTES DEL PLAN

3.1. Funcion principal del puesto

PROYECTO 1: PORTAL WEB INSTITUCIONAL

Desarrollar e implementar el Portal Web Institucional de la Direccion de Proyeccion Social y Extension Cultural de la UNA Puno aplicando una metodologia agil Scrum ligero adaptada a un equipo reducido de desarrollo. El proyecto comprende el analisis de requerimientos, definicion de estructura de navegacion, implementacion de interfaces, desarrollo del frontend, construccion del backend, configuracion de base de datos, preparacion de entorno de despliegue y documentacion tecnica.

El avance analizado corresponde al 50 % del Proyecto 1 y se sustenta en el contenido existente dentro de la carpeta `paginacarmen/WebInstitucionalDPSEC`. La carpeta evidencia que ya se encuentra implementada una version funcional base del portal institucional, compuesta por un frontend React/Vite y un backend FastAPI conectado a PostgreSQL.

El frontend presenta una estructura de aplicacion de una sola pagina con enrutamiento mediante React Router. Se han definido las rutas principales del portal: Inicio, Nosotros, Documentos de Gestion y Eventos. La aplicacion cuenta con un layout general que incluye cabecera institucional, navegacion responsive, menu movil, logos oficiales de la UNA Puno y DPSEC, pie de pagina institucional, datos de contacto y enlaces a redes sociales.

La pagina de Inicio incorpora un hero visual con carrusel de noticias destacadas, controles de navegacion, indicadores de diapositivas, seccion de eventos recientes con paginacion, accesos a suboficinas, videos destacados y acciones sugeridas. Asimismo, se integran imagenes institucionales de la Direccion de Proyeccion Social, Seguimiento al Graduado y Gestion Ambiental.

La pagina Nosotros implementa una vista institucional con secciones dinamicas consumidas desde la API, permitiendo mostrar informacion como equipo, mision, vision y valores. Tambien incorpora indicadores referenciales para proyectos, convenios y voluntariado, lo que aporta una base visual para comunicar el alcance institucional de la oficina.

La pagina Documentos de Gestion implementa busqueda por nombre, filtros por categoria, listado paginado de documentos, visualizacion de metadatos y enlace de descarga. Esta seccion ya se conecta al backend mediante Axios y consume endpoints de categorias y documentos.

La pagina Eventos implementa consulta de eventos desde la API, paginacion, estados de carga, manejo de errores y tarjetas visuales reutilizables. Esta funcionalidad permite publicar actividades institucionales, jornadas comunitarias y espacios de colaboracion.

El backend se encuentra estructurado con FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic, Alembic y PostgreSQL. La API define rutas publicas y administrativas, configuracion CORS, servicio de archivos estaticos para cargas, endpoint de salud y separacion modular por capas: modelos, esquemas, dependencias, seguridad, configuracion, base de datos y rutas.

La base de datos ya cuenta con modelos para usuarios, noticias, eventos, categorias de documentos, documentos, secciones institucionales, suboficinas y configuraciones del sitio. La migracion inicial Alembic crea las tablas correspondientes, indices para fechas de eventos y documentos, claves foraneas y restricciones unicas para campos relevantes como correo de usuario, slug de categoria y clave de seccion institucional.

Tambien existe un script de datos iniciales que crea un usuario administrador local, noticias destacadas, eventos, categorias, documentos, secciones institucionales, suboficinas y configuraciones generales del portal. Esto permite probar el sistema con informacion base sin depender de carga manual inicial.

El proyecto incluye configuracion de Docker Compose para levantar PostgreSQL 16, archivo de requerimientos del backend, archivo de configuracion de Alembic, variables de entorno de ejemplo y README con instrucciones de instalacion, migracion, seed y ejecucion del backend y frontend.

Hasta el 50% del plan, el proyecto presenta una base funcional solida para continuar con integracion completa, panel administrativo visual, carga real de contenidos, pruebas funcionales ampliadas, despliegue en servidor institucional y elaboracion de manuales. No se evidencia aun un despliegue final en servidor UNA Puno ni documentacion completa de usuario final, por lo que esas actividades deben mantenerse para la segunda mitad del proyecto.

3.2. Actividades principales que se desprenden de la funcion del puesto y del perfil del estudiante

PROYECTO 1: PORTAL WEB INSTITUCIONAL

Actividad	Unidad de Medida	Meta	Tiempo	Avance al 50 %
Fase 1: Levantamiento y analisis de requerimientos, definicion de casos de uso y planificacion del proyecto mediante metodologia agil Scrum ligero.	Documento tecnico / estructura funcional	Definir alcance del portal, secciones principales, roles de administracion y contenidos institucionales.	7 dias	Completado. El proyecto ya refleja una arquitectura funcional con secciones principales: Inicio, Nosotros, Documentos de Gestion y Eventos. Tambien se identifican entidades de contenido: noticias, eventos, documentos, categorias, secciones institucionales, suboficinas y configuracion del sitio.
Fase 2: Diseno de prototipos UX/UI y validacion de interfaces del Portal Web Institucional.	Prototipo / Diseno implementado	Definir estructura visual, navegacion, componentes de tarjetas, carrusel, filtros, paginacion y responsive.	7 dias	Completado en implementacion base. El frontend contiene layout institucional, cabecera responsive, menu movil, hero con carrusel, tarjetas de eventos, tarjetas de noticias, videos, filtros, paginacion y pie de pagina.
Fase 3: Desarrollo frontend del portal institucional e integracion de las suboficinas utilizando tecnologias modernas.	Repositorio / URL local	Portal web funcional con integracion inicial de suboficinas y consumo de API.	20 dias	Avance parcial alto dentro del 50 %. Se implementaron rutas publicas, paginas principales, componentes reutilizables, consumo de API con Axios, estados de carga y error, filtros y paginacion. Falta completar integracion de contenidos reales, panel administrativo visual y ajustes finales de experiencia de usuario.

Actividad	Unidad de Medida	Meta	Tiempo	Avance al 50 %
Fase 4: Virtualizacion, dockerizacion y despliegue del sistema en entornos cloud y servidor institucional de la UNA Puno.	Servidor configurado / contenedores	Contenedores Docker y entorno de despliegue configurado y operativo.	8 dias	Avance inicial. Existe Docker Compose para PostgreSQL 16 y configuracion backend para conexion a base de datos, CORS, uploads y variables de entorno. No se evidencia despliegue final en servidor institucional ni contenedor completo para frontend/backend.
Fase 5: Validacion funcional, pruebas de integracion y optimizacion responsive del portal web.	Reporte de pruebas	Sistema validado, responsive y con pruebas funcionales completadas.	5 dias	Avance inicial. Se verifico compilacion del frontend con npm run build y compilacion sintactica del backend con compileall. Falta reporte formal de pruebas, pruebas end-to-end, validacion responsive documentada y pruebas con usuarios.
Fase 6: Elaboracion de documentacion tecnica, manual de usuario y manual de mantenimiento del sistema.	Documento tecnico	Documentacion tecnica y manuales finales entregados.	5 dias	Avance parcial. Existe README con instrucciones para frontend, backend, migraciones, seed y ejecucion local. Falta documentacion tecnica completa, manual de usuario, manual de mantenimiento y guia de despliegue institucional.

4. ANALISIS DETALLADO DEL AVANCE DEL PROYECTO EN LA CARPETA `paginacarmen`

4.1. Estructura general encontrada

La carpeta contiene el proyecto `WebInstitucionalDPSEC`, organizado como una aplicacion web moderna con dos partes principales:

- Frontend: ubicado en la raiz del proyecto, desarrollado con React, Vite, Tailwind CSS, React Router, Axios y Lucide React.

- Backend: ubicado en la carpeta backend, desarrollado con FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic, Alembic, PostgreSQL, JWT y soporte de carga de archivos.

Esta division demuestra una arquitectura cliente-servidor, donde el frontend se encarga de la interfaz publica del portal y el backend proporciona datos, seguridad, persistencia y administracion de contenidos.

4.2. Avance del frontend

El frontend cuenta con los siguientes archivos y modulos principales:

- `src/App.jsx`: define las rutas principales de la aplicacion.
- `src/layouts/Layout.jsx`: define cabecera, navegacion, menu responsive, contenido principal y pie de pagina.
- `src/pages/Home.jsx`: implementa la pagina de inicio institucional.
- `src/pages/About.jsx`: implementa la pagina Nosotros.
- `src/pages/Documents.jsx`: implementa documentos de gestion con busqueda, filtros y paginacion.
- `src/pages/Events.jsx`: implementa listado de eventos con paginacion.
- `src/services/api.js`: configura Axios para consumir el backend.
- `src/components/EventCard.jsx`, `NewsCard.jsx`, `VideoCard.jsx`: componentes visuales reutilizables.
- `src/components/ui/Pagination.jsx`: componente comun de paginacion.
- `src/data/mockData.js`: datos mock usados en secciones visuales del portal.
- `public/images`: logos e imagenes institucionales.

La implementacion frontend evidencia avance en:

- Navegacion principal institucional.
- Diseno responsive para escritorio y dispositivos moviles.
- Hero con carrusel de noticias.
- Accesos a suboficinas: Proyeccion Social, Graduados y Gestion Ambiental.
- Visualizacion de eventos recientes.
- Visualizacion de videos destacados.
- Accesos sugeridos a convocatorias, convenios y reportes.

- Pagina institucional Nosotros con secciones dinamicas.
- Pagina de documentos con filtros por categoria, busqueda por texto, metadatos y descarga.
- Pagina de eventos con paginacion.
- Manejo de estados de carga y errores en vistas conectadas a API.
- Uso de iconografia moderna mediante Lucide React.
- Estilos con Tailwind CSS y CSS institucional complementario.

4.3. Avance del backend

El backend cuenta con una estructura modular:

- `backend/app/main.py`: crea la aplicacion FastAPI, configura CORS, archivos estaticos, routers publicos, routers administrativos y endpoint de salud.
- `backend/app/models.py`: define los modelos de base de datos.
- `backend/app/schemas.py`: define esquemas Pydantic para entrada y salida de datos.
- `backend/app/api/public.py`: define endpoints publicos.
- `backend/app/api/admin.py`: define endpoints administrativos protegidos.
- `backend/app/api/deps.py`: contiene dependencias de autenticacion.
- `backend/app/core/security.py`: gestiona hash de contraseñas y tokens.
- `backend/app/core/config.py`: centraliza configuracion de entorno.
- `backend/app/db/session.py` y `base.py`: configuran conexion y base declarativa.
- `backend/app/seed.py`: carga datos iniciales.
- `backend/alembic/versions/20260518_0001_initial.py`: migracion inicial.

El backend evidencia avance en:

- API REST organizada por rutas publicas y administrativas.
- Autenticacion administrativa por token JWT.
- Verificacion de contraseñas con hash.
- Endpoint de login administrativo.
- CRUD administrativo para noticias.
- CRUD administrativo para eventos.
- CRUD administrativo para categorias de documentos.

- CRUD administrativo para documentos.
- CRUD administrativo para secciones institucionales.
- CRUD administrativo para suboficinas.
- CRUD administrativo para configuraciones del sitio.
- Carga de archivos con validacion de extensiones permitidas: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, JPEG, PNG y WEBP.
- Endpoints publicos para noticias destacadas, eventos, categorias, documentos, secciones institucionales, suboficinas y configuracion del sitio.
- Paginacion para eventos y documentos.
- Búsqueda de documentos por titulo.
- Filtrado de documentos por categoria.
- Servicio de archivos subidos mediante ruta publica.
- Endpoint /health para verificacion basica del servicio.

4.4. Avance de base de datos

La base de datos esta modelada con SQLAlchemy y migrada con Alembic. Las tablas definidas son:

- `users`: usuarios administrativos.
- `news`: noticias del portal.
- `events`: eventos institucionales.
- `document_categories`: categorias de documentos.
- `documents`: documentos de gestion.
- `institutional_sections`: secciones informativas de la pagina Nosotros.
- `offices`: suboficinas vinculadas.
- `site_settings`: configuraciones generales del portal.

La migracion inicial incluye:

- Claves primarias.
- Restricciones unicas para correo, slug de categoria y clave institucional.
- Relacion entre documentos y categorias.
- Indices para fecha de eventos y fecha de documentos.
- Campos de publicacion para controlar visibilidad.
- Campos de auditoria en varias entidades mediante fechas de creacion y actualizacion.

4.5. Avance de configuracion y despliegue local

El proyecto incluye:

- `package.json` con scripts `dev`, `build` y `preview`.
- `vite.config.js` para configuracion del frontend.
- `tailwind.config.js` y `postcss.config.js` para estilos.
- `backend/requirements.txt` con dependencias del backend.
- `backend/docker-compose.yml` para PostgreSQL 16.
- `backend/alembic.ini` para migraciones.
- `backend/.env.example` para variables de entorno.
- `README.md` con pasos para instalacion y ejecucion.

Esto demuestra que el proyecto ya puede prepararse en entorno local, levantar base de datos, ejecutar migraciones, cargar datos iniciales y correr frontend/backend durante desarrollo.

4.6. Evidencia de verificacion tecnica realizada


Durante el analisis del avance se verifico:

- Compilacion del frontend con `npm run build`: exitosa.
- Compilacion sintactica del backend con `compileall app`: exitosa.

Estas verificaciones permiten afirmar que, al momento del corte, el codigo fuente tiene una base funcional y compilable. Sin embargo, aun falta completar pruebas funcionales formales, pruebas de integracion con base de datos levantada, pruebas de carga de archivos, pruebas de autenticacion y pruebas responsive documentadas.

5. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

El siguiente organigrama representa la organizacion funcional del Proyecto 1: Portal Web Institucional. Se consideran los niveles de supervision academica, direccion del area receptora, coordinacion del proyecto, equipo de practicantes y componentes tecnicos del sistema desarrollado en la carpeta `paginacarmen/WebInstitucionalDPSEC`.

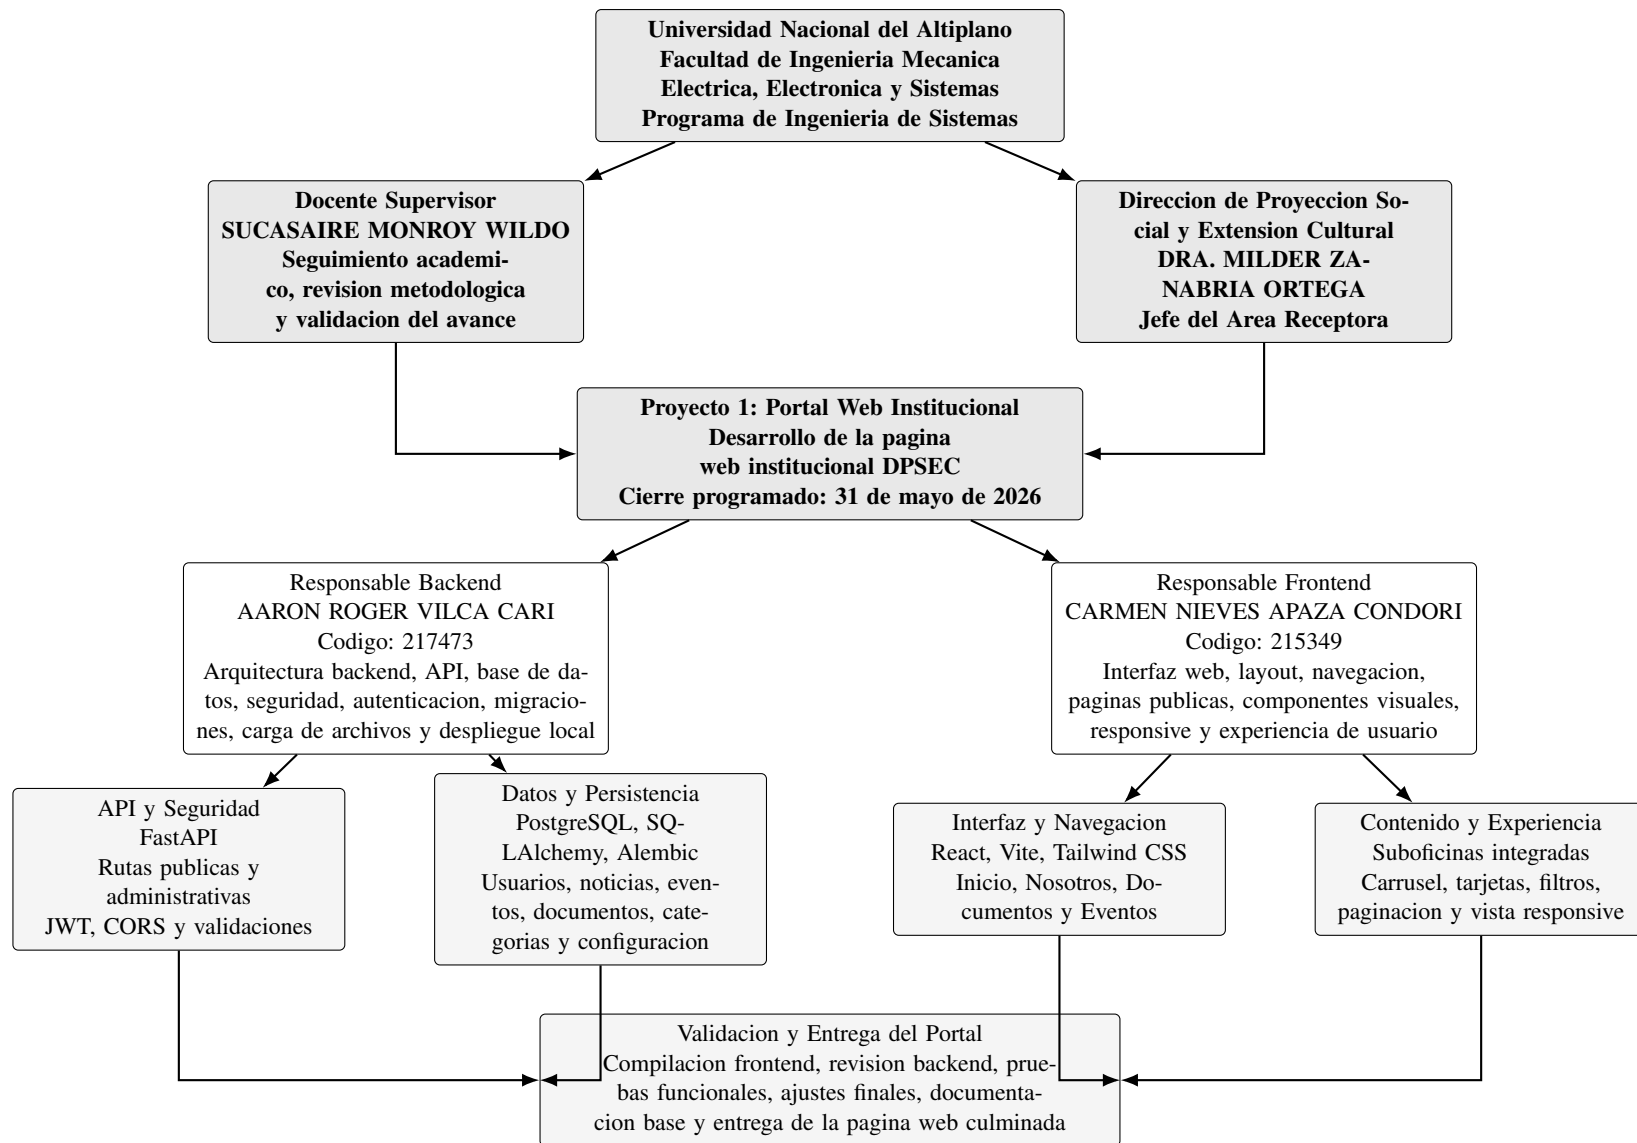

5.1. Descripción de roles y responsabilidades

Rol / Unidad	Responsable	Funciones dentro del Proyecto 1
Docente Supervisor	SUCASAIRE MONROY WILDO	Realiza seguimiento academico, orienta la metodologia del plan de trabajo, revisa el cumplimiento de actividades y valida el avance presentado por los practicantes.
Jefatura del Area Receptora	DRA. MILDER ZANABRIA ORTEGA	Define necesidades institucionales, valida el enfoque funcional del portal web y representa a la Direccion de Proyeccion Social y Extension Cultural como area beneficiaria.
Practicante 1	AARON ROGER VILCA CARI	Responsable del backend del portal institucional. Se encarga de la arquitectura tecnica del servidor, API con FastAPI, modelos SQLAlchemy, base de datos PostgreSQL, migraciones Alembic, autenticacion, seguridad, carga de archivos, endpoints publicos y administrativos, pruebas de compilacion y preparacion del entorno local.
Practicante 2	CARMEN NIEVES APAZA CONDORI	Responsable del frontend del portal institucional. Se encarga del diseno de interfaz, estructura visual, navegacion, paginas publicas, componentes reutilizables, organizacion del contenido institucional, estilos responsive, validacion visual y experiencia de usuario.
Modulo Frontend	CARMEN NIEVES APAZA CONDORI	Implementa las paginas Inicio, Nosotros, Documentos de Gestion y Eventos; integra componentes reutilizables como tarjetas, carrusel, filtros, paginacion, layout responsive, enlaces a suboficinas y elementos visuales institucionales.

Rol / Unidad	Responsable	Funciones dentro del Proyecto 1
Modulo Backend	AARON ROGER VILCA CARI	Implementa la API con FastAPI, rutas publicas, rutas administrativas, autenticacion JWT, carga de archivos, control de errores, conexion con base de datos, migraciones, seed inicial y configuracion del entorno backend.
Base de Datos	AARON ROGER VILCA CARI	Define las entidades principales del portal: usuarios, noticias, eventos, documentos, categorias, secciones institucionales, suboficinas y configuracion del sitio, usando PostgreSQL, SQLAlchemy y Alembic.
Validacion y Entrega	Ambos practicantes con supervision	Comprende compilacion del frontend, revision sintactica del backend, pruebas funcionales, ajustes responsive, documentacion base y entrega de la pagina web institucional culminada al 31 de mayo de 2026.

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES / DIAGRAMA DE GANTT

PROYECTO 1: PORTAL WEB INSTITUCIONAL

Leyenda: **XX** actividad ejecutada o programada dentro del periodo; – actividad no programada para esa semana.

El cronograma del Proyecto 1 se encuentra programado para culminar el desarrollo completo de la pagina web institucional el 31 de mayo de 2026. Por ello, las actividades del portal se concentran entre abril y mayo, dejando el cierre tecnico, pruebas, ajustes finales y entrega base dentro de la ultima semana de mayo.

N	ACTIVIDAD / META	ABR 1	ABR 2	ABR 3	ABR 4	MAY 1	MAY 2	MAY 3	MAY 4
1	Levantamiento y analisis de requerimientos, definicion de estructura funcional y planificacion del portal institucional.	XX	XX	–	–	–	–	–	–
2	Diseno de estructura UX/UI, navegacion, layout institucional, componentes visuales y responsive inicial.	–	XX	XX	–	–	–	–	–
3	Desarrollo frontend de rutas principales: Inicio, Nosotros, Documentos de Gestion y Eventos.	–	–	XX	XX	XX	–	–	–
4	Integracion de componentes reutilizables: tarjetas, paginacion, carrusel, filtros, estados de carga y errores.	–	–	–	XX	XX	XX	–	–
5	Desarrollo backend con FastAPI, modelos, esquemas, rutas publicas y rutas administrativas.	–	–	–	–	XX	XX	XX	–
6	Modelado de base de datos, migracion Alembic, seed inicial y configuracion PostgreSQL.	–	–	–	–	–	XX	XX	–
7	Configuracion inicial de Docker Compose, variables de entorno, uploads y README tecnico.	–	–	–	–	–	–	XX	XX
8	Integracion completa de contenidos reales y ajuste final de identidad institucional.	–	–	–	–	–	–	XX	XX
9	Panel administrativo visual para gestionar noticias, eventos, documentos, secciones y configuracion.	–	–	–	–	–	–	XX	XX
10	Preparacion de entorno de ejecucion, build de produccion y configuracion base para despliegue del portal.	–	–	–	–	–	–	–	XX
11	Validacion funcional, pruebas de integracion, pruebas responsive y correcciones finales.	–	–	–	–	–	–	–	XX
12	Documentacion tecnica base, manual de usuario preliminar, manual de mantenimiento y entrega del portal web culminado.	–	–	–	–	–	–	–	XX

7. RESUMEN DEL AVANCE AL 50 %

El avance del Proyecto 1 se estima en 50 % porque ya se encuentra implementada la base tecnica principal del portal: frontend funcional, rutas publicas, componentes visuales, consumo de API, backend modular, modelos de datos, migracion inicial, endpoints publicos y administrativos, autenticacion, carga de archivos, seed de datos y configuracion local con PostgreSQL.

El avance completado cubre principalmente las fases de analisis, diseno base, desarrollo frontend inicial, desarrollo backend inicial y configuracion tecnica local. La segunda mitad del Proyecto 1 se concentra en la ultima semana de mayo, con el objetivo de completar el panel administrativo visual, cargar contenidos reales, consolidar la integracion frontend-backend, ejecutar pruebas funcionales documentadas, optimizar la vista responsive, preparar el build de produccion y entregar la pagina web culminada el 31 de mayo de 2026.

8. ACTIVIDADES PENDIENTES PARA COMPLETAR EL 100 %

- Completar integracion de datos reales de la Direccion de Proyeccion Social y Extension Cultural.
- Crear o completar una interfaz administrativa visual para gestionar contenidos sin depender solo de endpoints API.
- Validar credenciales, roles y flujo de administracion con usuarios responsables.
- Probar carga real de archivos y descarga desde la seccion Documentos de Gestion.
- Completar imagenes, textos, enlaces y datos oficiales de contacto.
- Corregir textos con problemas de codificacion en algunas vistas del frontend.
- Ejecutar pruebas responsive en escritorio, tablet y movil.
- Ejecutar pruebas de integracion con PostgreSQL levantado mediante Docker.
- Preparar contenedores o configuracion de despliegue para frontend y backend.
- Coordinar despliegue en servidor institucional de la UNA Puno.
- Elaborar manual tecnico de instalacion, despliegue y mantenimiento.
- Elaborar manual de usuario para administradores de contenido.
- Elaborar reporte de pruebas y acta de validacion funcional.

9. CONCLUSION

El proyecto paginacarmen/WebInstitucionalDPSEC muestra un avance tecnico significativo y coherente con el 50% del Plan de Trabajo del Proyecto 1: Portal Web Institucional. La implementacion existente supera una simple maqueta visual, ya que incorpora arquitectura frontend-backend, base de datos, API, autenticacion, migraciones, datos iniciales y configuracion de entorno local.

El estado actual permite continuar hacia una segunda etapa orientada a consolidacion, pruebas, administracion de contenidos, despliegue y documentacion. Por ello, el avance puede considerarse como una primera mitad funcional del portal institucional, con componentes esenciales ya desarrollados y con pendientes claramente identificados para completar la entrega final.

10. ANEXO: EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL AVANCE

Las siguientes capturas fueron tomadas de la carpeta fotospagina y se incorporan como evidencia visual del avance de la pagina web institucional desarrollada para el Proyecto 1: Portal Web Institucional.



Figura 1: Evidencia 1: vista funcional de la pagina web institucional.

Jefe inmediato del Centro de
Practicas

Docente supervisor



Figura 2: Evidencia 2: avance de interfaz, contenido y estructura visual.

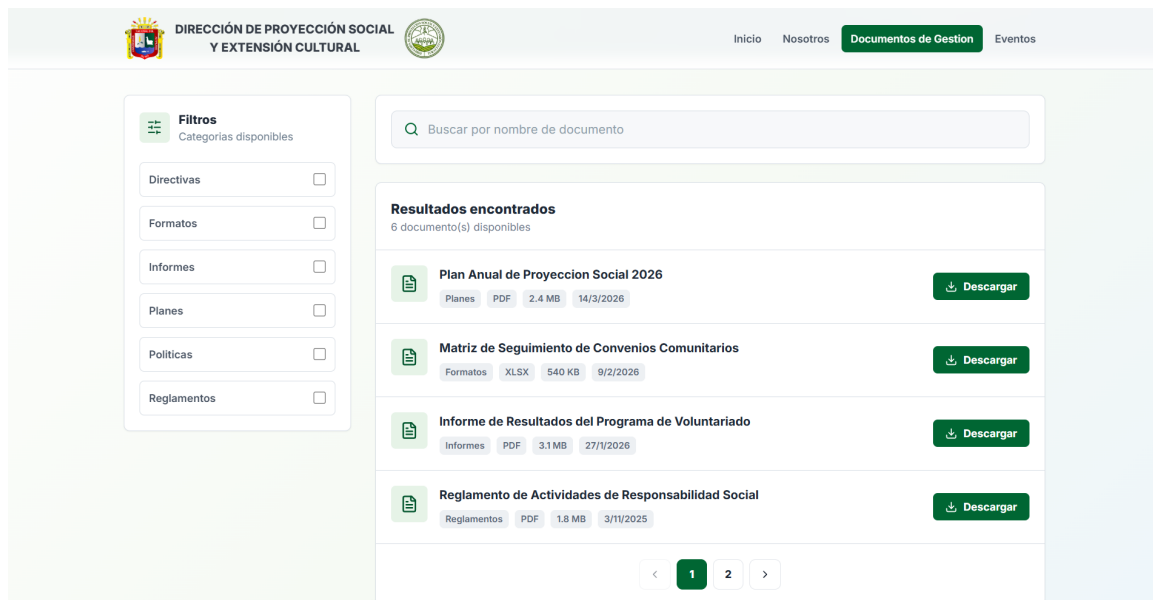


Figura 3: Evidencia 3: componentes y secciones implementadas del portal.



Figura 4: Evidencia 4: validacion visual del avance del portal web.
